



**FSC**

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



**AMBITO TERRITORIALE  
OTTIMALE SALERNO**

Ente d'Ambito per il servizio  
di gestione integrata dei rifiuti



**EcoAmbiente Salerno**



## Revamping e ristrutturazione dell'impianto di selezione rifiuti sito in Casal Velino (SA)

### PROGETTO DEFINITIVO

**Committente:** Ecoambiente Salerno

**Progettisti:** Ingegnere Giuseppe D'Acunzi  
Ingegnere Paolo D'Acunzi

**Gruppo di lavoro:** Dott.ssa Giulia D'Elia

**RUP:** Ingegnere Emilia Barba

**Elaborato:** ***CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO***

SCALA

--

REL.03

REVISIONE

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

00

PRIMA EMISSIONE

FEBBRAIO 2021

01

02


03

PROGETTO:

"REVAMPING E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI SELEZIONE RIFIUTI NEL COMUNE DI CASAL VELINO LOCALITA' VALLO SCALO"

CUP ASSEGNATO: G74H20000870002

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INIZIO ATTIVITA'	FINE ATTIVITA'	DURATA ATTIVITA'	PERCENTUALE DI AVANZAMENTO
PARTE A : FASE AMMINISTRATIVA					
Attività 01	Ammissione a finanziamento (decreto)	26/02/2021	01/04/2021	34	4,99%
Attività 02	Autorizzazione art.208 sulla progettazione definitiva	01/04/2021	30/07/2021	120	22,61%
Attività 03	Gara lavori appalto integrato	21/04/2021	08/09/2021	140	28,49%
Attività 04	Aggiudicazione definitiva	08/09/2021	07/11/2021	60	37,30%
Attività 05	Stipula Contratto d'appalto	07/11/2021	07/12/2021	30	41,70%
Attività 06	Redazione progetto esecutivo	07/12/2021	05/02/2022	60	50,51%
Attività 07	Verifica Progettazione esecutiva, validazione e approvazione	05/02/2022	17/03/2022	40	56,39%
Tot. gg. (A)				384	
PARTE B: ESECUZIONE LAVORI E COLLAUDO					
Attività 07	Consegna lavori e allestimento cantiere	17/03/2022	01/04/2022	15	58,59%
Attività 08	Sistemazione aree esterne	01/04/2022	20/05/2022	49	65,79%
Attività 09	Pesa e locale controllo	13/05/2022	24/06/2022	42	70,93%
Attività 10	Locale quadri elettrici	24/06/2022	05/08/2022	42	77,09%
Attività 11	Tettoia stoccaggio rampa	05/08/2022	16/09/2022	42	83,26%
Attività 12	Tettoia stoccaggio sud	05/08/2022	16/09/2022	42	83,26%
Attività 13	Locale deposito	20/08/2022	25/09/2022	36	84,58%
Attività 14	Capannone	25/09/2022	20/11/2022	56	92,80%
Attività 15	Revamping impianto di selezione	13/05/2022	09/12/2022	210	95,59%
Attività 16	Smobilizzo cantiere	09/12/2022	24/12/2022	15	97,80%
Attività 17	Collaudo	09/12/2022	08/01/2023	30	100,00%
Tot. gg. (B)				297	
TOTALE gg. (A+B)				681	

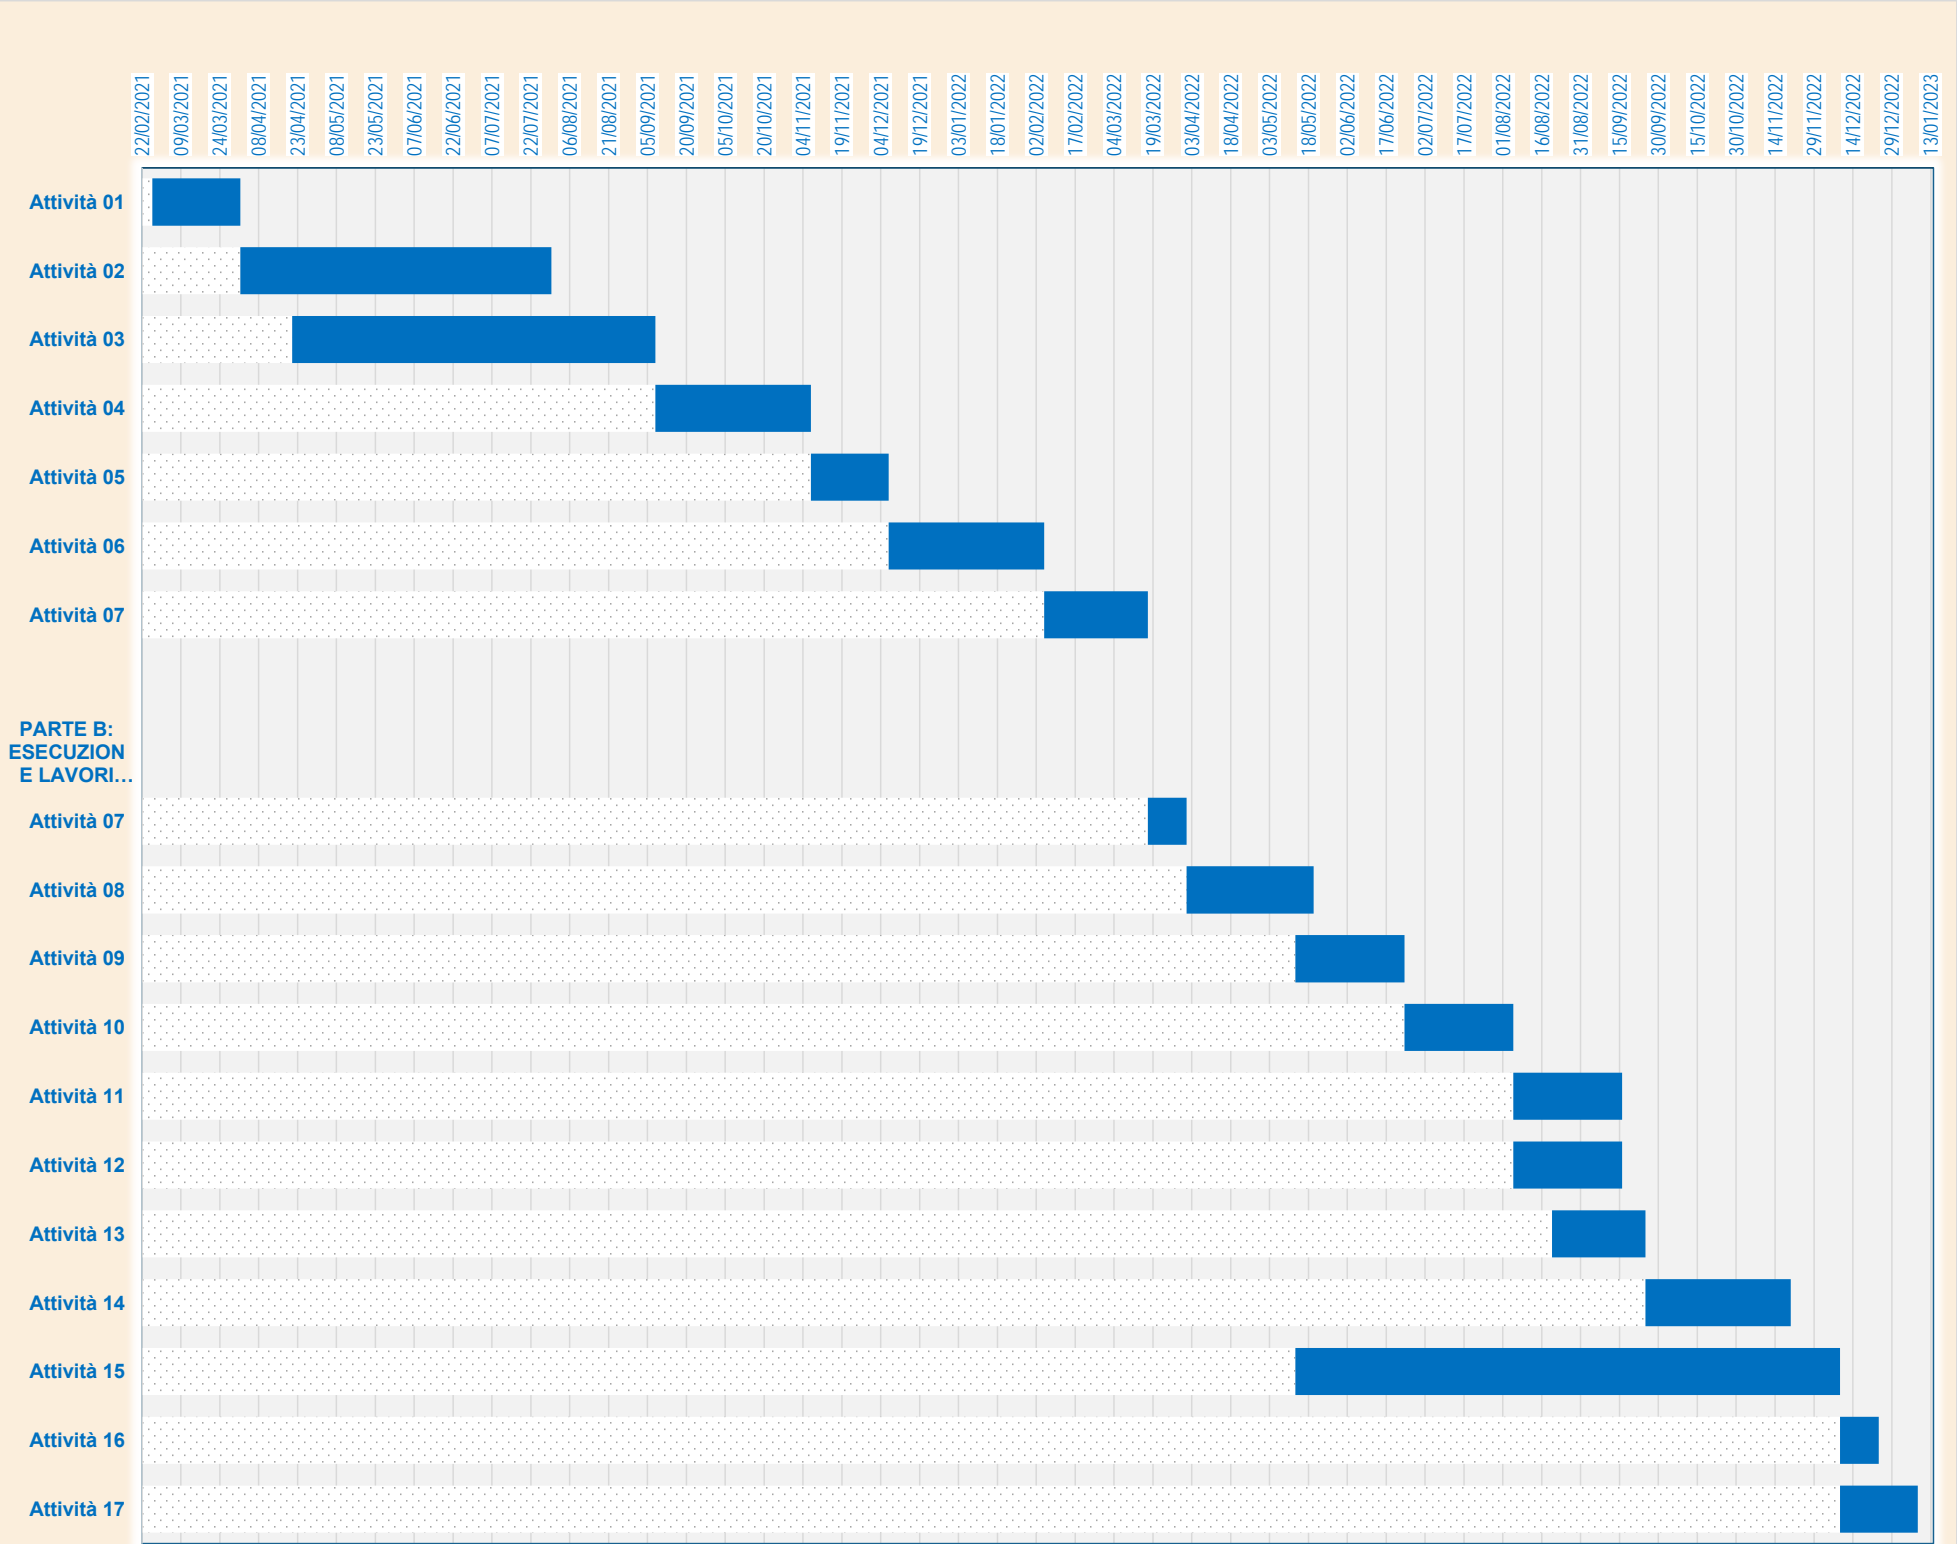

PROGETTO:

"REVAMPING E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI SELEZIONE RIFIUTI NEL COMUNE DI CASAL VELINO LOCALITA' VALLO SCALO"

CUP ASSEGNATO: G74H20000870002

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITA'	INIZIO ATTIVITA'	FINE ATTIVITA'	DURATA ATTIVITA'
PARTE B : DETTAGLIO FASE DI ESECUZIONE LAVORI				
Attività 07	Consegna lavori e allestimento cantiere	17/03/2022	01/04/2022	15
Attività 08	Sistemazione aree esterne	01/04/2022	20/05/2022	49
	Aree verdi	01/04/2022	06/04/2022	5
	Recinzione e parapetti	06/04/2022	21/04/2022	15
	Impianto d'illuminazione	11/04/2022	21/04/2022	10
	Impianto di videosorveglianza	11/04/2022	21/04/2022	10
	Impianto antincendio	21/04/2022	06/05/2022	15
	Rete raccolta delle acque reflue	29/04/2022	13/05/2022	14
	Pavimentazione	06/05/2022	20/05/2022	14
Attività 09	Pesa e locale controllo	13/05/2022	24/06/2022	42
	Finiture esterne/interne	13/05/2022	10/06/2022	28
	Rete raccolta delle acque reflue	03/06/2022	17/06/2022	14
	Impianto elettrico	10/06/2022	24/06/2022	14
Attività 10	Locale quadri elettrici	24/06/2022	05/08/2022	42
	Finiture esterne/interne	24/06/2022	08/07/2022	14
	Rete raccolta delle acque reflue	01/07/2022	15/07/2022	14
	Impianto elettrico	08/07/2022	05/08/2022	28
Attività 11	Tettoia stoccaggio rampa	05/08/2022	16/09/2022	42
	Finiture esterne/interne	05/08/2022	19/08/2022	14
	Opere in ferro	15/08/2022	24/08/2022	9
	Rete raccolta delle acque reflue	24/08/2022	30/08/2022	6
	Impianto elettrico	30/08/2022	03/09/2022	4
	Impianto antincendio	03/09/2022	08/09/2022	5
	Pavimentazione	08/09/2022	16/09/2022	8
Attività 12	Tettoia stoccaggio sud	05/08/2022	16/09/2022	42
	Pavimentazione	05/08/2022	19/08/2022	14
	Finiture esterne/interne	15/08/2022	24/08/2022	9
	Opere in ferro	24/08/2022	30/08/2022	6
	Rete raccolta delle acque reflue	30/08/2022	03/09/2022	4
	Impianto elettrico	03/09/2022	08/09/2022	5
	Impianto antincendio	08/09/2022	16/09/2022	8
Attività 13	Locale deposito	20/08/2022	25/09/2022	36
	Finiture esterne/interne	20/08/2022	29/08/2022	9
	Opere in ferro	29/08/2022	04/09/2022	6
	Rete raccolta delle acque reflue	04/09/2022	08/09/2022	4
	Impianto elettrico	08/09/2022	13/09/2022	5
	Impianto antincendio	13/09/2022	25/09/2022	12
Attività 14	Capannone	25/09/2022	20/11/2022	56
	Pavimentazione	25/09/2022	16/10/2022	21
	Finiture esterne/interne	09/10/2022	30/10/2022	21
	Opere in ferro	23/10/2022	13/11/2022	21
	Rete raccolta delle acque reflue	23/10/2022	13/11/2022	21
	Impianto antincendio	23/10/2022	13/11/2022	21
	Impianto idrico-sanitario	23/10/2022	13/11/2022	21
	Impianto elettrico	23/10/2022	20/11/2022	28
Attività 15	Revamping impianto di selez	13/05/2022	09/12/2022	210
	Opere elettromeccaniche	13/05/2022	09/12/2022	210
	Trasporto a recupero: Impianti, tubazioni e opere accessorie	13/05/2022	09/12/2022	210
Attività 16	Smobilizzo cantiere	09/12/2022	24/12/2022	15
TOTALE gg.				282

